N.	Descrizione	Fase critica	Inizio fase	Fine fase	Durata	Uomini	U/GG.
	Diagramma di Gantt				43		120
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE							
1	Allestimento cantiere	X	21/10/19	21/10/19	1	2	2
2	Impianto termico: posa nuova caldaia		22/10/19	19/11/19	20	3	60
3	Scavo	X	20/11/19	22/11/19	3	3	9
4	Posa tubazione riscaldamento interrata		25/11/19	28/11/19	4	2	8
5	Reinterro e ripristino ghiaia		29/11/19	03/12/19	3	3	9
6	Interventi vari e nuova canna fumaria	X	04/12/19	10/12/19	5	3	15
7	Smantellamento vecchia caldaia		11/12/19	13/12/19	3	2	6
8	Bonifica serbatoio di gasolio e rimozione	X	16/12/19	18/12/19	3	3	9
9	Smantellamento cantiere		19/12/19	19/12/19	1	2	2

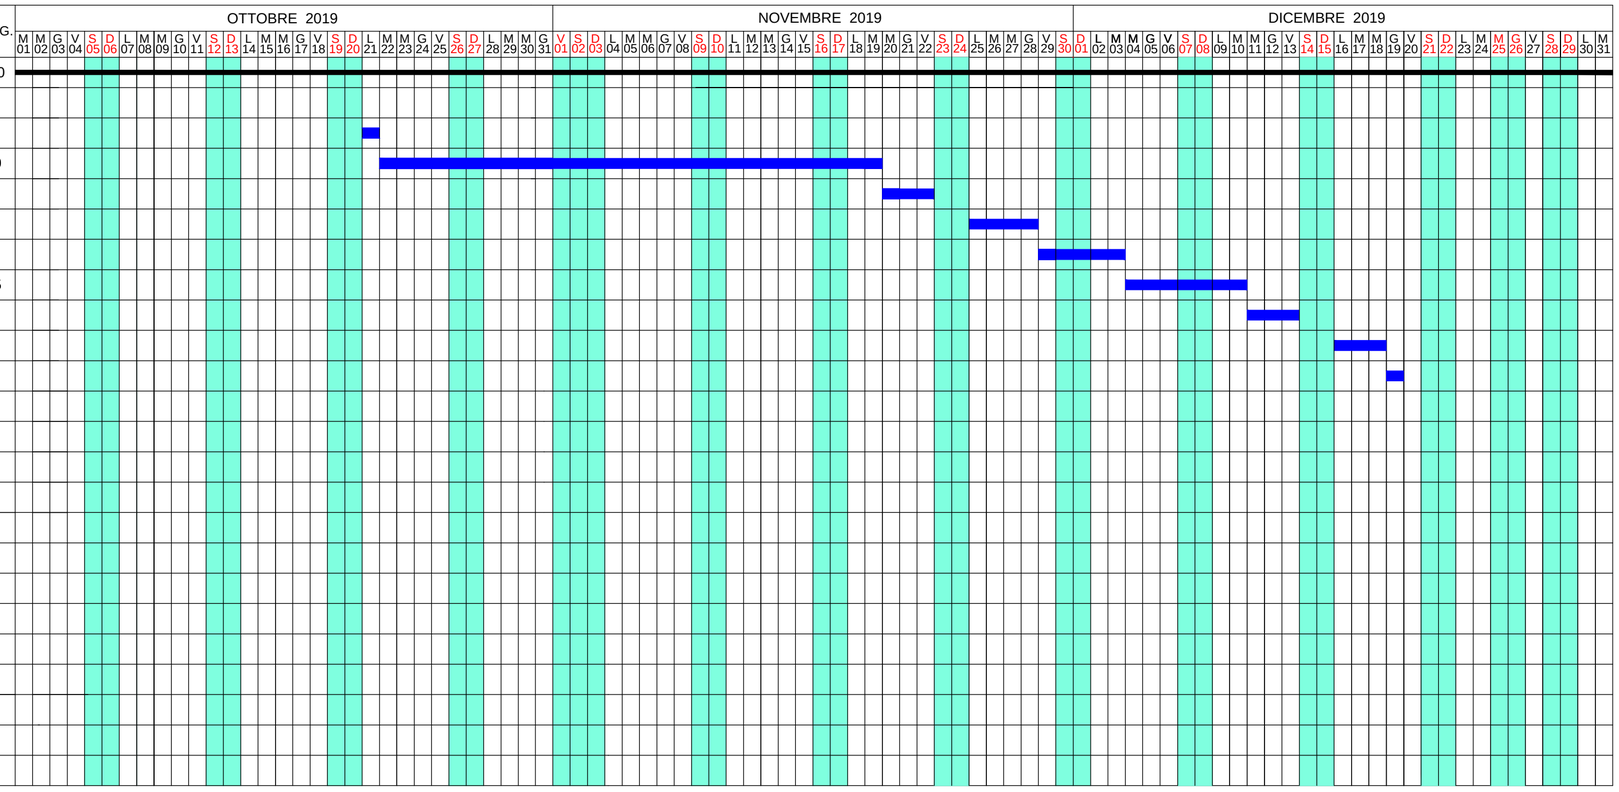

Giorni lavorativi

Giorni festivi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(Diagramma di Gantt)
